

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre
							Semestre 1, 2017
1		1	ESTUDIO DE MERCADO	45 días	mar 06/02/18	lun 09/04/18	
2		1.1	Solicitud y recepción de cotizaciones para integrar estudio de factibilidad	45 días	mar 06/02/18	lun 09/04/18	
3		2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	20 días	lun 02/04/18	vie 27/04/18	
4		2.1	Integración de todos los componentes que integran el estudio: descripción, alcance, diagrama conceptual, anexo técnico, análisis costo beneficio y cronograma de	20 días	lun 02/04/18	vie 27/04/18	
5		3	DICTAMEN TÉCNICO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	8 días	lun 30/04/18	mié 09/05/18	
6		3.1	Envío en plataforma del Estudio al OIC	1 día	lun 30/04/18	lun 30/04/18	4
7		3.2	Recepción y atención a observaciones en su caso	6 días	mar 01/05/18	mar 08/05/18	6
8		3.3	Emisión de dictamen técnico	1 día	mié 09/05/18	mié 09/05/18	7
9		4	GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA SFP	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	
10		4.1	Remisión de estudio de factibilidad	1 día	jue 10/05/18	jue 10/05/18	8
11		4.2	Recepción y atención de observaciones	13 días	vie 11/05/18	mar 29/05/18	10
12		4.3	Emisión de dictamen técnico	1 día	mié 30/05/18	mié 30/05/18	11
13		5	PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE LICITACIÓN	14 días	vie 01/06/18	mié 20/06/18	

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre
							Semestre 1, 2017
14		5.1	Entrega de anexo técnico y evaluación de puntos y porcentajes a la DRMyS	1 día	vie 01/06/18	vie 01/06/18	12
15		5.2	Participación en el Comité Revisor de Bases	1 día	lun 04/06/18	lun 04/06/18	14
16		5.3	Participación en junta de aclaraciones	1 día	jue 07/06/18	jue 07/06/18	15
17		5.4	Participación en apertura de propuestas técnicas	1 día	lun 11/06/18	lun 11/06/18	16
18		5.5	Análisis y evaluación de propuestas técnicas	1 día	mar 12/06/18	mar 12/06/18	17
19		5.6	Presentación del dictamen técnico ante el Comité	1 día	jue 14/06/18	jue 14/06/18	18
20		5.7	fallo de procedimiento de adquisición	1 día	vie 15/06/18	vie 15/06/18	19
21		6	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	4 días	sáb 16/06/18	mié 20/06/18	
22		6.1	Reuniones de arranque con proveedor adjudicado	1 día	lun 18/06/18	lun 18/06/18	20
23		6.2	Minutas de asuntos y acuerdos de las sesiones en el desarrollo de proyecto	1 día	mar 19/06/18	mar 19/06/18	22
24		6.3	inicio de servicios contratados a terceros	1 día	mié 20/06/18	mié 20/06/18	20
25		6.4	Seguimiento al servicio contratado	138 días	jue 21/06/18	lun 31/12/18	

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	


Semestre 2, 2017

Semestre 1, 2018

Semestre 2, 2018

Semestre 1, 2019

Semestre 2, 2019

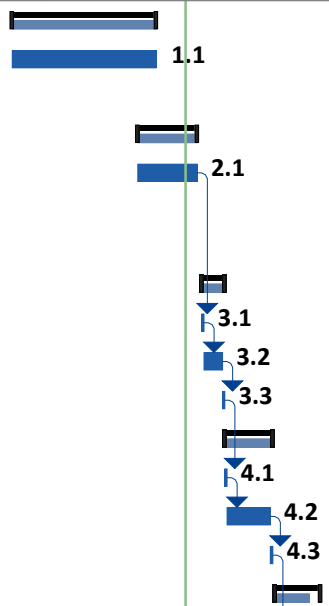

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	


Semestre 2, 2017

Semestre 1, 2018

Semestre 2, 2018

Semestre 1, 2019

Semestre 2, 2019

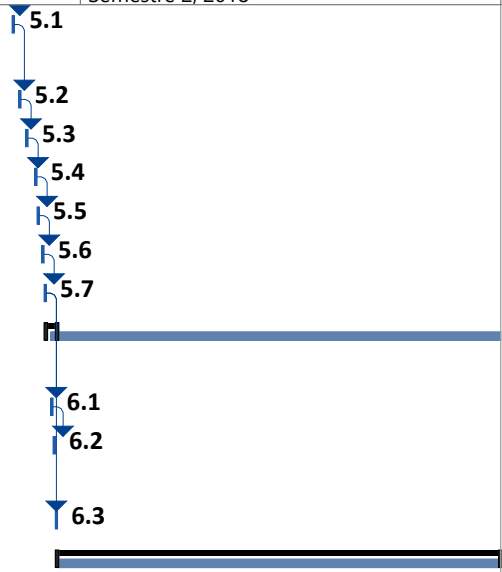

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	

Semestre 2, 2017






















Semestre 1, 2018

Semestre 2, 2018

Semestre 1, 2019

Semestre 2, 2019

6.4.1

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	
